Ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ և Անկախ աուդիտորի եզրակացություն

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ

«Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագիր»

ՎԶՄԲ Վարկ 8229-AM

ՎԶՄԲ Վարկ 8523-AM

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և այդ ամսաթվին ավարտված տարվա համար

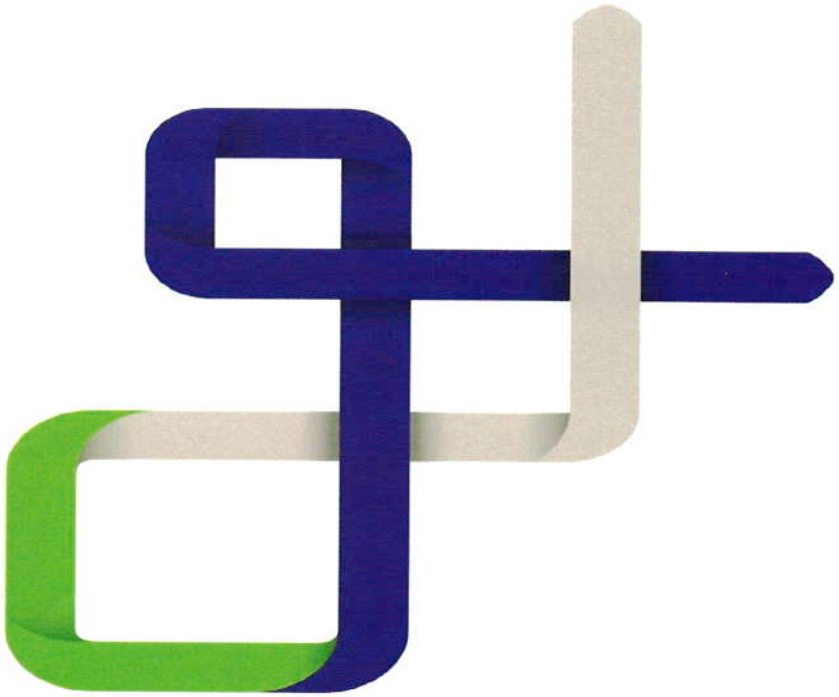

Բովանդակություն

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն	3
Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն	7
Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին համախմբված հաշվետվություն	8
Ըստ Ծրագրի բաղադրիչների ֆինանսավորման օգտագործման մասին համախմբված հաշվետվություն	9
ԾՄՀ ընթացակարգերով դրամական միջոցների ստացման դիմումներ	10
Հատուկ հաշվի հաշվետվություն	11
Հատուկ հաշվի հաշվետվություն	12
Ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ	13

Grant Thornton

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն

Գրանթ Թորնթոն ՓԲԸ
ՀՀ, ք.Երևան 0012
Վաղարշյան 8/1
Հ. + 374 10 260 964
Ֆ.+ 374 10 260 961

Grant Thornton CJSC
8/1 Vagharshyan Str.
0012 Yerevan, Armenia
T + 374 10 260 964
F + 374 10 260 961

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը

Կարծիք

Մենք աուդիտի ենք ենթարկել Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի (ՎԶՄԲ) 8229-AM և 8523-AM վարկային համաձայնագրերի շրջանակներում ֆինանսավորվող «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի» (Ծրագիր) կից ներկայացված ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ, ընդ որում այդ հաշվետվությունները ներառում են 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվությունը, Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին համախմբված հաշվետվությունը, ըստ Ծրագրի բաղադրիչների ֆինանսավորման օգտագործման մասին համախմբված հաշվետվությունը, հատուկ հաշվի հաշվետվությունները՝ 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և նույն ամսաթվին ավարտված տարվա համար, ինչպես նաև ծախսերի մասին հաշվետվությունները (ԾՄՀ), որոնք ներկայացվել են Համաշխարհային Բանկ՝ 2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար՝ 8229-AM և 8523-AM վարկային համաձայնագրերի շրջանակներում համալրումները հիմնավորելու նպատակով, հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության ամփոփ նկարագիրը և այլ պարզաբանող ծանոթագրություններ:

Մեր կարծիքով, կից ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները տալիս են 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի» ֆինանսական վիճակի և նույն ամսաթվին ավարտված տարվա ընթացքում ստացված ֆոնդերի և ճանաչված ծախսերի ճշմարիտ և իրական պատկերը՝ համաձայն ծանոթագրություն 2-ում նկարագրված հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության, Համաշխարհային Բանկի ուղեցույցների, 8229-AM և 8523-AM վարկային համաձայնագրերի համապատասխան հոդվածների:

Ի հավելումն, մեր կարծիքով, ներկայացված ԾՄՀ-ները, ինչպես նաև դրանց պատրաստման համար ներդրված ներքին վերահսկողությունը և ընթացակարգերը կարող են վստահելի հիմք հանդիսանալ 8229-AM և 8523-AM վարկային համաձայնագրերի շրջանակներում համալրումների համար:

Կարծիքի հիմք

Մենք աուդիտն իրականացրել ենք աուդիտի միջազգային ստանդարտներին (ԱՄՍ) համապատասխան: Այդ ստանդարտներից բխող մեր պատասխանատվությունը լրացուցիչ նկարագրված է մեր եզրակացության՝ «Աուդիտորի պատասխանատվությունը ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար» բաժնում: Մենք անկախ ենք «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ից (Կազմակերպություն)՝ համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության պրոֆեսիոնալ հաշվապահների վարքագրքի (ՀՄԴ-ի Վարքագիրք) և Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառելի՝ ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի նկատմամբ վարքագծի պահանջների, և մենք կատարել ենք վարքագծի նկատմամբ մեր մյուս պարտականությունները՝ այդ պահանջների համաձայն: Մենք համոզված ենք, որ ձեռք ենք բերել բավականաչափ ու համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ՝ մեր կարծիքն արտահայտելու համար:

Հանգամանքների շեշտադրում

- Մենք ուշադրություն ենք հրավիրում ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություն 2-ի վրա, որը վերաբերում է հաշապահական հաշվառման հիմունքներին: Ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստված են օժանդակելու Կազմակերպության ղեկավարությանը՝ Համաշխարհային Բանկի ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման պահանջներին համապատասխանելու համար: Ուստի, ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները չեն կարող կիրառվել այլ նպատակով: Մեր կարծիքը չի ձևափոխվել այս հանգամանքի առնչությամբ:
- Մենք ուշադրություն ենք հրավիրում ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություն 12-ի վրա, որտեղ ներկայացված է նոր տիպի COVID-19 հիվանդության տարածման ազդեցությունը: Մեր կարծիքը չի ձևափոխվել այս հանգամանքի առնչությամբ:

Ղեկավարության և կառավարման օղակներում ներգրավված անձանց պատասխանատվությունը ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների համար

Կազմակերպության ղեկավարությունը պատասխանատու է սույն ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման և ճշմարիտ ներկայացման համար՝ համաձայն ծանոթագրություն 2-ում նկարագրված հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության, Համաշխարհային Բանկի ուղեցույցների, ինչպես նաև 8229-AM և 8523-AM վարկային համաձայնագրերի համապատասխան հոդվածների: Այդ նպատակով ղեկավարությունը սահմանում է անհրաժեշտ վերահսկողության համակարգ, որը թույլ է տալիս պատրաստել ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ, որոնք ազատ են խարդախության կամ սխալի արդյունքում էական խեղաթյուրումից:

Կառավարման օղակներում ներգրավված անձինք պատասխանատու են ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման գործընթացը վերահսկելու համար:

Աուդիտորի պատասխանատվությունը ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար

Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ հավաստիացում առ այն, որ ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները բոլոր էական առումներով զերծ են էական խեղաթյուրումներից՝ անկախ դրանց՝ խարդախության կամ սխալի հետևանքով առաջացման հանգամանքից, և ներկայացնել մեր կարծիքը ներառող աուդիտորի եզրակացություն: Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր մակարդակի հավաստիացում է, բայց այն չի երաշխավորում, որ ԱՄՍ-ներին համապատասխան իրականացված աուդիտը միշտ կհայտնաբերի էական խեղաթյուրումը, երբ այն առկա է: Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ խարդախության կամ սխալի արդյունքում և համարվում են էական, երբ խելամտորեն կարող է ակնկալվել, որ դրանք առանձին կամ միասին վերցրած կազդեն ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններն օգտագործողների՝ այդ ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների հիման վրա կայացվող տնտեսական որոշումների վրա:

ԱՄՍ-ների համաձայն իրականացրած աուդիտի ողջ ընթացքում մենք կիրառում ենք մասնագիտական դատողություն և պահպանում ենք մասնագիտական կասկածամտություն: Բացի այդ, մենք.

- Հատկորոշում և գնահատում ենք խարդախության կամ սխալի հետևանքով ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների էական խեղաթյուրման ռիսկերը, նախագծում և իրականացնում ենք աուդիտորական ընթացակարգեր՝ այդ ռիսկերին արձագանքելու նպատակով, և ձեռք ենք բերում աուդիտորական ապացույցներ, որոնք բավարար ու համապատասխան հիմք են հանդիսանում մեր կարծիքի համար: Խարդախության հետևանքով առաջացած էական խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկն ավելի բարձր է, քան սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրման չհայտնաբերման ռիսկը, քանի որ խարդախությունը կարող է ներառել հանցավոր համաձայնություն, զեղծարարություն, միտումնավոր բացթողումներ, սխալ ներկայացումներ կամ ներքին վերահսկողության համակարգի չարաշահում:
- Ձեռք ենք բերում աուդիտին վերաբերող ներքին վերահսկողության մասին պատկերացում՝ տվյալ հանգամանքներին համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր նախագծելու և ոչ թե Կազմակերպության ներքին վերահսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու համար:
- Գնահատում ենք հաշվապահական հաշվառման կիրառված քաղաքականության տեղին լինելը, ինչպես նաև ղեկավարության կատարած հաշվապահական հաշվառման գնահատումների և կից բացահայտումների խելամտությունը:
- Գնահատում ենք ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների ընդհանուր ներկայացումը, կառուցվածքը և բովանդակությունը, ներառյալ բացահայտումները, ինչպես նաև ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների հիմքում ընկած գործարքների ու դեպքերի ճշմարիտ ներկայացումը:

Grant Thornton

Այլ հարցերի հետ մեկտեղ մենք տեղեկացնում ենք կառավարման օղակներում ներգրավված անձանց աուդիտի առաջադրանքի պլանավորված շրջանակների և ժամկետների, ինչպես նաև աուդիտի ընթացքում հայտնաբերված նշանակալի հարցերի մասին, ներառյալ ներքին վերահսկողությանը վերաբերող նշանակալի թերությունները:

Արմեն Հովհաննիսյան

Տնօրեն

18 հունիսի 2020թ.

Էմիլ Վասիլյան

Առաջադրանքի պատասխանատու

Ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվություն

ԱՄՆ դոլար

	Ծանոթ.	2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Ակտիվներ			
Ակտիվներ			
Ծրագրի կուտակային ծախսեր (վարկային համաձայնագիր թիվ 8229-AM և վարկային համաձայնագիր թիվ 8523-AM)		99,922,564	89,629,001
Կանխավճարներ	4	470,715	41,118
Մնացորդներ բանկերում	5	618,617	329,775
Ընդամենը ակտիվներ		101,011,896	89,999,894
Ֆոնդեր և պարտավորություններ			
Ծրագրի կուտակային ֆինանսավորում (վարկային համաձայնագիր թիվ 8229-AM)	7	43,270,669	43,270,669
Ծրագրի կուտակային ֆինանսավորում (վարկային համաձայնագիր թիվ 8523-AM)	7	36,775,999	27,774,661
Կառավարության համաֆինանսավորում (վարկային համաձայնագիր թիվ 8229-AM)	8	10,780,492	10,779,813
Կառավարության համաֆինանսավորում (վարկային համաձայնագիր թիվ 8523-AM)	8	8,998,177	7,012,549
Այլ		69,225	64,061
Փոխարժեքային տարբերություն		86,961	85,072
Կրեդիտորական պարտքեր	6	1,030,373	1,013,069
Ընդամենը ֆոնդեր և պարտավորություններ		101,011,896	89,999,894

Ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատվել են 2020թ. հունիսի 18-ին

Արամ Գուգարաց
Տնօրենի պաշտոնակատարի պարտականությունները կատարող

Նարինե Միքայելյան
Ֆինանսական կառավարման և հաշվապահական հաշվառման ղեկավար, Գլխավոր հաշվապահ

Այս հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 13-ից մինչև 24-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ:

Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին համախմբված հաշվետվություն

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և նույն ամսաթվին ավարտված տարի

ԱՄՆ դոլար

	Փաստացի		Պլանավորված		Տարբերություն		
	2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	Ծրագիր
Ֆոնդերի աղբյուրներ							
Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորում (տե՛ս ծանոթ. 7)							
ՎԶՄԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 8229-AM	-	43,270,669					
ՎԶՄԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 8523-AM	9,001,338	36,775,999					
Կառավարության համաֆինանսավորում (տե՛ս ծանոթ. 8)							
ՎԶՄԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 8229-AM	679	10,780,492					
ՎԶՄԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 8523-AM	1,985,628	8,998,177					
Այլ	5,164	69,225					
Ընդամենը	10,992,809	99,894,562					
Փոխարժեքային տարբերություն	1,889	86,961					
Նվազեցնել. Ֆինանսավորման օգտագործում							
ՎԶՄԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 8229-AM							
Ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական ծառայություններ, խորհրդատուների ծառայություններ, Ծրագրի լրացուցիչ գործառնական ծախսեր (տե՛ս ծանոթ. 9)	3,603	53,967,559	3,597	57,796,699	6	(3,829,140)	56,109,375
Սկզբնավճար	-	112,500	-	112,500	-	-	112,500
Ընդամենը ՎԶՄԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 8229-AM	3,603	54,080,059	3,597	57,909,199	6	(3,829,140)	56,221,875
ՎԶՄԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 8523-AM							
Ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական ծառայություններ, խորհրդատուների ծառայություններ, Ծրագրի լրացուցիչ գործառնական ծախսեր և վերապատրաստումներ (բացառությամբ Ծրագրի Մաս 1(ե)) և 2 (բ) (ա)-ի (տե՛ս ծանոթ. 9)	10,289,960	45,742,505	13,259,534	51,006,003	(2,969,574)	(5,263,498)	49,900,000
Սկզբնավճար	-	100,000	-	100,000	-	-	100,000
Ընդամենը ՎԶՄԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 8523-AM	10,289,960	45,842,505	13,259,534	51,106,003	(2,969,574)	(5,263,498)	50,000,000
Ընդամենը	10,293,563	99,922,564	13,263,131	109,015,202	(2,969,568)	(9,092,638)	
Շրջանառու կապիտալի զուտ աճ (տե՛ս ծանոթ. 10)	701,135	58,959					

Այս հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 13-ից մինչև 24-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ:

Ըստ Ծրագրի բաղադրիչների ֆինանսավորման օգտագործման մասին համախմբված հաշվետվություն

2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և նույն ամսաթվին ավարտված տարի

	Փաստացի		Պլանավորված		Տարբերություն		
	2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	Ծրագիր
ՎԶՄԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 8229-AM							
Մաս 1: Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավում	-	51,785,215	-	54,703,863	-	(2,918,648)	52,390,000
Ճանապարհի բարելավման աշխատանքներ	-	*42,106,838*	-	*44,766,474*	-	*(2,659,636)*	*41,510,000*
Հիմնանորոգման և պահպանության փորձնական պայմանագիր	-	*5,600,786*	-	*5,562,400*	-	*38,386*	*6,760,000*
Միկրոձեռնարկությունների միջոցով ընդրված հատվածների ընթացիկ պահպանություն՝ փորձնական հիմքով	-	-	-	-	-	-	*170,000*
Նախագծային ուսումնասիրություն և տեխնիկական հսկողություն	-	*3,861,349*	-	*4,154,989*	-	*(293,640)*	*3,700,000*
Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարձացում և վտանգավոր հատվածների բարելավում	-	*216,242*	-	*220,000*	-	*(3,758)*	*250,000*
Մաս 2: Ծրագրի կառավարում և ինստիտուցիոնալ հզորացում	3,603	2,182,344	3,597	3,092,836	6	(910,492)	3,719,375
Աջակցություն Ծրագրի համակարգմանն ու իրականացմանը, ներառյալ աուդիտ	*3,603*	*909,550*	*3,597*	*1,090,519*	*6*	*(180,969)*	*1,109,375*
Ակտիվների կառավարման ճանապարհային համակարգ և հետազոտման սարքավորումների ձեռքբերում	-	*427,197*	-	*1,134,668*	-	*(707,471)*	*500,000*
Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության տեխնիկական աջակցություն	-	-	-	-	-	-	*250,000*
Տեխնիկական աջակցություն	-	*845,597*	-	*867,649*	-	*(22,052)*	*1,860,000*
Ընդամենը ՎԶՄԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 8229-AM	3,603	53,967,559	3,597	57,796,699	6	(3,829,140)	56,109,375
ՎԶՄԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 8523-AM							
Մաս 1: Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավում	9,915,240	44,217,741	12,866,902	48,701,846	(2,951,662)	(4,484,105)	46,710,000
Ճանապարհի բարելավման աշխատանքներ	*8,779,493*	*39,806,324*	*10,910,513*	*42,389,281*	*(2,131,020)*	*(2,582,957)*	*37,420,000*
Հիմնանորոգման և պահպանության փորձնական պայմանագիր	-	-	-	-	-	-	*5,090,000*
Նախագծային ուսումնասիրություն և տեխնիկական հսկողություն	*1,135,747*	*4,411,417*	*1,956,389*	*6,312,565*	*(820,642)*	*(1,901,148)*	*4,200,000*
Մաս 2: Ծրագրի կառավարում և ինստիտուցիոնալ հզորացում	374,720	1,524,764	392,632	2,304,157	(17,912)	(779,393)	3,190,000
Աջակցություն Ծրագրի համակարգմանն ու իրականացմանը, ներառյալ աուդիտ	*286,001*	*793,779*	*287,864*	*804,175*	*(1,863)*	*(10,396)*	*1,040,000*
Ակտիվների կառավարման ճանապարհային համակարգ և հետազոտման սարքավորումների ձեռքբերում	*72,440*	*692,315*	*71,935*	*1,181,850*	*505*	*(489,535)*	*440,000*
Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության տեխնիկական աջակցություն	-	-	-	-	-	-	*230,000*
Տեխնիկական աջակցություն	*16,279*	*38,670*	*32,833*	*318,132*	*(16,554)*	*(279,462)*	*1,480,000*
Ընդամենը ՎԶՄԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 8523-AM	10,289,960	45,742,505	13,259,534	51,006,003	(2,969,574)	(5,263,498)	49,900,000
Ընդամենը	10,293,563	99,710,064	13,263,131	108,802,702	(2,969,568)	(9,092,638)	

Ծրագրի բաղադրիչների ֆինանսավորման օգտագործման մասին համախմբված հաշվետվությունը 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ չի ներառում 212,500 ԱՄՆ դոլար սկզբնավճարը: Սույն հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 13-ից մինչև 24-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ:

ԾՄՀ ընթացակարգերով դրամական միջոցների ստացման դիմումներ

ՎԶՄԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 8229-AM
2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
ԱՄՆ դոլար

	Հոդված
Դիմումի համար	Ծրագրի ներքո ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական ծառայություններ, խորհրդատվական ծառայություններ և գործառնական ծախսեր
30-DA	2,820
Ընդամենը	2,820

ՎԶՄԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 8523-AM
2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար
ԱՄՆ դոլար

	Հոդված
Դիմումի համար	Ծրագրի ներքո ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական ծառայություններ, խորհրդատվական ծառայություններ և գործառնական ծախսեր
23-DA	3,762,020
25-DA	1,742,568
29-DA	978,848
30-DA	1,443,313
Ընդամենը	7,926,749

Այս հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 133-ից մինչև 24-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ:

Հատուկ հաշվի հաշվետվություն

ՎՀՄԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 8229-ԱՄ
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և այդ ամսաթվին ավարտված տարվա համար
ԱՄՆ դոլար

Սկզբնական մնացորդ 2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ		41,871
Ավելացնել.		
Կուտակային չբացահայտված անհամապատասխանություն		-
Վարկի համալրում տարվա ընթացքում	-	
	-	-
Նվազեցնել. Հատուկ հաշվից փոխհատուցում Համաշխարհային Բանկին տարվա ընթացքում		-
Հատուկ հաշվին կանխավճարով տրված գումարի ներկա մնացորդը (1)		41,871
Վերջնական մնացորդ 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ		38,995
Ավելացնել.		
Ժամանակաշրջանի ընթացքում վճարված ընդունելի ծախսերի գումար	2,876	
Ծառայության վճարներ (եթե առկա է)	-	
	2,876	2,876
Նվազեցնել. Ստացված տոկոսագումարներ (եթե կրեդիտագրվել են հատուկ հաշվին)		
Ընդամենը հաշվառված կանխավճար (2)		41,871
Բացահայտման ենթակա անհամապատասխանություն (1) – (2)		-

Այս հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 13-ից մինչև 24-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ:

Հատուկ հաշվի հաշվետվություն

ՎՀՄԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 8523-AM
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և այդ ամսաթվին ավարտված տարվա համար
ԱՄՆ դոլար

Սկզբնական մնացորդ 2019թ. հունվարի 1-ի դրությամբ		139,495
Ավելացնել.		
Կուտակային չբացահայտված անհամապատասխանություն		-
Վարկի համալրում տարվա ընթացքում	9,001,338	
	9,001,338	9,001,338
Նվազեցնել. Հատուկ հաշվից փոխհատուցում Համաշխարհային Բանկին տարվա ընթացքում		-
Հատուկ հաշվին կանխավճարով տրված գումարի ներկա մնացորդը (1)		9,140,833
Վերջնական մնացորդ 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ		570,230
Ավելացնել.		
Ժամանակաշրջանի ընթացքում վճարված ընդունելի ծախսերի գումար	8,570,603	
Ծառայության վճարներ (եթե առկա է)	-	
	8,570,603	8,570,603
Նվազեցնել. Ստացված տոկոսագումարներ (եթե կրեդիտագրվել են հատուկ հաշվին)		
Ընդամենը հաշվառված կանխավճար (2)		9,140,833
Բացահայտման ենթակա անհամապատասխանություն (1) – (2)		-

Այս հաշվետվությունը պետք է ընթերցվի ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների բաղկացուցիչ մասը կազմող 13-ից մինչև 24-րդ էջերում ներկայացված կից ծանոթագրությունների հետ մեկտեղ:

Ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

1 Գործունեություն

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ը իրավահաջորդն է Հայաստանի Հանրապետության Տարացքային Կառավարման և Ենթակառուցվածքների նախարարության «Տրանսպորտի ԾԻԳ» Պետական Հիմնարկի իրավահաջորդը և ստեղծվել է որպես պետական ոչ առևտրային կազակերպություն՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 1304-Ա որոշմամբ: Համաձայն 2019թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ N 1969-Ա որոշմամբ, «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ը վերանվանվել է «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ (Կազմակերպություն):

Կազմակերպությունն իրականացնում է կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագիրը» («Ծրագիր»), որը ֆինանսավորվում է 2013թ. փետրվարի 11-ին կնքված 8229-AM վարկային համաձայնագրով՝ ստորագրված Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի (ՎԶՄԲ) և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջև:

Ծրագրի նպատակն է ընտրված կենսական նշանակության ճանապարհները բարելավելու միջոցով բարելավել շուկաների և ծառայությունների հասանելիությունը գյուղական համայնքների համար և հզորացնել Կազմակերպության կարողությունը՝ կառավարելու համար կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցը:

Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ մասերից՝

Մաս 1: Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավում

- Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի մոտ 147 կմ երկարությամբ ընտրված ճանապարհների բարելավման աշխատանքների իրականացում:
- Հիմնանորոգման և պահպանության երկու փորձնական պայմանագրերի պայմաններով մոտ 23 կմ երկարությամբ՝ ընտրված կենսական նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգում և ընթացիկ պահպանություն:
- Ծրագրի շրջանակում հիմնանորոգման աշխատանքների համար մանրամասն նախագծային ուսումնասիրություն, տեխնիկական հսկողություն և անկախ տեխնիկական աուդիտներ:
- Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարձրացման միջոցառումների իրականացում, այդ թվում՝ դրանց վտանգավոր հատվածների բարելավում:

Մաս 2: Ծրագրի կառավարում և ինստիտուցիոնալ հզորացում

- Աջակցություն Ծրագրի համակարգմանն ու իրականացմանը Ծրագրի կառավարման ու մոնիտորինգի համար պահանջվող գործառնական ծախսերի (այդ թվում՝ ֆինանսական աուդիտների) ֆինանսավորման միջոցով:
- Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ծրագրի իրականացում, ի թիվս այլ հարցերի՝ ա) ճանապարհների վտանգավոր հատվածների բարելավման աշխատանքների համար մանրամասն նախագծերի պատրաստում, բ) վերապատրաստման ծրագրեր ՀԱՃՏ-ի անձնակազմի համար, գ) ճանապարհային

անվտանգության կրթական ծրագրեր Ծրագրում ընդգրկված գյուղերի դպրոցներում, և դ) կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի հետ կապված՝ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության քարոզարշավների իրականացում:

- Տեխնիկական աջակցության տրամադրում, ի թիվս այլ հարցերի՝ ա) կատարողականի վրա հիմնված մոտեցման կիրառմամբ ճանապարհների հիմնանորոգման ու պահպանության համար իրագործելիության ուսումնասիրության իրականացման, այդ թվում՝ առնվազն մեկ ճանապարհային հատվածի նախանշման հարցում, բ) Ծրագրի հետ կապված սոցիալական մոնիտորինգի և գնահատման, ինչպես նաև ճանապարհային ոլորտի ֆինանսական կայունության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացման հարցում, գ) ՏԿԵՆ անձնակազմի և տեղական կապալառուների վերապատրաստման հարցում՝ Ծրագրի նոր գաղափարների, այդ թվում՝ կատարողականի վրա հիմնված բազմամյա պայմանագրերի նախագծման ու իրականացման, արդյունավետ նախագծային ստանդարտների և ՏԿԵՆ ու ՀԱՃՏ-ի անձնակազմի համար պլանավորման ու պայմանագրերի մոնիտորինգի վերաբերյալ, և դ) ճանապարհային ոլորտում ապագա հնարավոր ներդրումների նախապատրաստման համար պահանջվող տեխնիկական ուսումնասիրությունների իրականացման և մանրամասն նախագծերի իրականացում մշակման հարցում:

Համաձայն 2013թ. փետրվարի 11-ին կնքված 8229-AM վարկային համաձայնագրի՝ Ծրագիրն իրականացվում է հետևյալ հոդվածներով.

Հոդված	Ծախսերի ֆինանսավորում տոկոսով (ներառյալ հարկերը)	Հատկացված վարկային միջոցներ (ԱՄՆ դոլարով)
Ծրագրի ներքո ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական ծառայություններ, խորհրդատվական ծառայություններ և գործառնական ծախսեր	80 %	44,887,500
Սկզբնավճար		112,500
Ընդամենը		45,000,000

Սկզբնավճար

Հայաստանի Հանրապետության կողմից վճարվելիք սկզբնավճարը կազմում է վարկային գումարի 0.25%-ը:

Ծրագրի գումարները բաշխված են հետևյալ բաղադրիչների միջև.

Բաղադրիչներ	Բանկի ֆինանսավորում (ԱՄՆ դոլարով) (ներառյալ հարկերը)	Կառավարության ֆինանսավորում (ԱՄՆ դոլարով)	Ընդհանուր արժեք (ԱՄՆ դոլարով)
Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավում	41,912,000	10,478,000	52,390,000
Ծրագրի կառավարում և ինստիտուցիոնալ հզորացում	2,975,500	743,875	3,719,375
Ընդամենը Ծրագրի ծախսեր	44,887,500	11,221,875	56,109,375
Սկզբնավճար	112,500	-	112,500
Ընդամենը	45,000,000	11,221,875	56,221,875

Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի (ՎԶՄԲ) և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջև կնքված նոր Վարկային համաձայնագիրը («Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում») (Վարկ թիվ 8523-AM) ուժի մեջ է մտել 2015թ. օգոստոսի 26-ին՝ տրամադրելով լրացուցիչ ֆինանսավորում՝ 40,000,000 ԱՄՆ դոլար «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի» համար:

Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ մասերից՝

Մաս 1: Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավում

- Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի մոտ 360 կմ երկարությամբ ընտրված ճանապարհների բարելավման աշխատանքների իրականացում:
- Պիլոտային սկզբունքով (ա) հիմնանորոգման և ընթացիկ պահպանման աշխատանքների իրականացում կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի՝ մոտ 23.4 կմ երկարությամբ ընտրված հատված-ներում՝հիմնանորոգման և պահպանման պայմանագրի պայմանների համաձայն և (բ) հիմնանորոգման և պահպանման երկու պայմանագրերի շրջանակներում մոտ 23 կմ երկարությամբ ընտրված կենսական նշանակության ճանապարհների հիմնանորոգում և ընթացիկ պահպանություն:
- Ծրագրի շրջանակում հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով մանրամասն նախագծային ուսումնասիրության, տեխնիկական հսկողության աշխատանքների և անկախ տեխնիկական աուդիտի իրականացում:
- Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարձրացման միջոցառումների իրականացում, այդ թվում՝ (ա) ճանապարհի՝ վտանգավորության բարձր աստիճան ունեցող հատվածների բարելավում, (բ) Ծրագրի շրջանակներում հիմնանորոգված բոլոր ճանապարհներիին «Ապահով գյուղերի» իրականացման հետ կապված աշխատանքներ և (գ) ճանապարհային նշանների ձեռքբերում և տեղադրում:
- Թույլատրելի արտակարգ իրավիճակի, ինչպես նաև համաձայնագրում սահմանված պահանջները բավարարելու դեպքում աջակցության տրամադրում՝ թույլատրելի արտակարգ իրավիճակին արձագանքելու նպատակով՝ Վարկառուի տարածքում ընտրված ճանապարհային հատվածում նախագծման և ներդրումների իրականացման միջոցով:

Մաս 2: Ծրագրի կառավարում և ինստիտուցիոնալ հզորացում

- Ծրագրի համակարգման ու իրականացման նպատակով աջակցության տրամադրում ա) Ծրագրի կառավարման ու մոնիթորինգի համար պահանջվող գործառնական ծախսերի ֆինանսավորման միջոցով, ինչպես նաև բ) Ծրագրի ֆինանսական աուդիտի իրականացման միջոցով:
- Ճանապարհային ակտիվների կառավարման համակարգի տեղեկատվական բազայի ձեռքբերում, այդ թվում՝ տեղադրում և ՀԱՃՏ-ի անձնակազմի՝ նշված տեղեկատվական բազայի օգտագործման իմաստով վերապատրաստում, բ) ճանապարհային պայմանների և երթևեկության ուսումնասիրման նպատակով ճանապարհների հետազոտման սարքավորումների ձեռքբերում և դ) կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում՝ ճանապարհային ակտիվների կառավարման համակարգի համար:
- Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ծրագրի իրականացում, ի թիվս այլ հարցերի ա) ճանապարհների վտանգավոր հատվածների բարելավման աշխատանքների համար մանրամասն նախագծերի մշակում, բ) վերապատրաստման ծրագրեր ՀԱՃՏ-ի անձնակազմի համար, գ) ճանապարհային անվտանգության կրթական ծրագրեր Ծրագրում ընդգրկված ապահով գյուղերի դպրոցներում, և դ)

կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի հետ կապված ճանապարհային երթևեկության անվտանգության քարոզարշավների իրականացում, ե) ճանապարհային երթևեկության անվտանգության գործողությունների ծրագրի մշակում և զ) Ծրագրի Մաս 2 (գ) (ե) կետի ներքո մշակված գործողությունների ծրագրի ընտրված միջոցառումների իրականացում:

- Տեխնիկական աջակցության տրամադրում, ի թիվս այլ հարցերի՝ ա) կատարողականի վրա հիմնված մոտեցման կիրառմամբ ճանապարհների հիմնանորոգման ու պահպանության համար տեխնիկատնտեսական իրագործելիության ուսումնասիրության իրականացման, այդ թվում՝ առնվազն մեկ ճանապարհային հատվածի նախանշման հարցում, բ) Ծրագրի հետ կապված սոցիալական մոնիթորինգի և գնահատման, ինչպես նաև ճանապարհային ոլորտի ֆինանսական կայունության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացման հարցում, գ) ՏԿԵՆ անձնակազմի և տեղական կապալառուների վերապատրաստման հարցում՝ Ծրագրի նոր գաղափարների, այդ թվում՝ կատարողականի վրա հիմնված բազմամյա պայմանագրերի նախագծման ու իրականացման, արդյունավետ նախագծային ստանդարտների և ՏԿԵՆ ու ՀԱՃՏ-ի անձնակազմի համար պլանավորման ու պայմանագրերի մոնիթորինգի վերաբերյալ, դ) ճանապարհային ոլորտում ապագա հնարավոր ներդրումների նախապատրաստման համար պահանջվող տեխնիկական ուսումնասիրութ-յունների իրականացման և մանրամասն նախագծերի իրականացում մշակման հարցում, ե) կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի համար ռազմավարական զարգացման պլանի մշակում և զ) ճանապարհային ոլորտի համար աղետների ռիսկի իմաստով պատրաստվածության խթանում:

Համաձայն 2015թ. օգոստոսի 26-ին կնքված 8523-ԱՄ վարկային համաձայնագրի՝ Ծրագիրն իրականացվում է հետևյալ հոդվածներով.

Հոդված	Ծախսերի ֆինանսավորում տոկոսով (ներառյալ հարկերը)	Հատկացված վարկային միջոցներ (ԱՄՆ դոլարով)
Ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական ծառայություններ, խորհրդատուների ծառայություններ, Ծրագրի լրացուցիչ գործառնական ծախսեր և վերապատրաստումներ (բացառությամբ Ծրագրի Մաս 1(ե)) և 2 (բ) (ա)-ի)	80 %	39,900,000
Սկզբնավճար		100,000
Ընդամենը		40,000,000

Կազմակերպության իրավաբանական հասցեն է՝ ՀՀ, ք. Երևան, Նալբանդյան 28:

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում Կազմակերպության աշխատակիցների միջին թիվը կազմել է 16:

2 Պատրաստման հիմքերը

2.1 Համապատասխանություն

Ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստվել են հաշվապահական հաշվառման հաշվեգրման սկզբունքով, Համաշխարհային Բանկի ուղեցույցի, ինչպես նաև 8229-AM և 8523-AM վարկային համաձայնագրերի համապատասխան պահանջների համաձայն: Կարևոր հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունները բացահայտված են ստորև:

2.2 Գործառնական և ներկայացման արժույթ

Հայաստանի Հանրապետության ազգային արժույթը հայկական դրամն է (դրամ): Սույն ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացված են ԱՄՆ դոլարով (ներկայացման արժույթ):

Ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ պատրաստելիս ԱՄՆ դոլարից տարբեր այլ արժույթով իրականացված գործարքները գրանցվում են գործարքի նախորդ օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից հայտարարված հաշվարկային փոխարժեքով: Համաշխարհային բանկի միջոցներից Ծրագրի գործընկերներին կատարված ԱՄՆ դոլարից տարբեր այլ արժույթով արտահայտված ուղղակի վճարումները գրանցվում են client connection (https://clientconnection.worldbank.org) համակարգի փոխարժեքով: Յուրաքանչյուր հաշվետու ամսաթվի դրությամբ դրամական միջոցները, կանխավճարները և կրեդիտորական պարտքերը վերահաշվարկվում են՝ կիրառելով այդ ամսաթվի դրությամբ ՀՀ ԿԲ-ի կողմից սահմանված փոխարժեքը. 2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 1 ԱՄՆ դոլարը կազմում է 479.7 ՀՀ դրամ (2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 1 ԱՄՆ դոլարը կազմում՝ 483.75 ՀՀ դրամ): Փոխարժեքային տարբերությունը ճանաչվում է ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին հաշվետվությունում և փոխարժեքային տարբերության կուտակված գումարը բացահայտվում է ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում՝ «Փոխարժեքային տարբերություն» հոդվածում:

2.3 Ծրագրի ֆինանսավորում

8229-AM և 8523-AM վարկային համաձայնագրերի շրջանակներում հատկացված ֆինանսավորումը հաշվառվում է ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվությունում որպես «Ծրագրի կուտակային ֆինանսավորում» և ճանաչվում է յուրաքանչյուր համալրման ժամանակ: Ի լրումն, տարվա ընթացքում ստացված ֆոնդերը բացահայտվում են Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին համախմբված հաշվետվությունում:

2.4 Ծրագրի ծախսեր

Ծրագրի ծախսերը ճանաչվում են հաշվեգրման սկզբունքով: Ծրագրի կուտակային ծախսերը բացահայտվում են ֆինանսական վիճակի մասին համախմբված հաշվետվությունում՝ ոչ ընթացիկ ակտիվներում: Ի հավելումն՝ ծախսերը ներառվում են Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին և ըստ Ծրագրի հիմնական հոդվածների ֆինանսավորման օգտագործման մասին համախմբված հաշվետվություններում: Ի լրումն, ծանոթագրություն 9-ում ներկայացված է ծախսերի բաշխումն ըստ կատեգորիաների:

2.5 Կանխավճարներ

Կանխավճարները, որոնք ներառում են դեռևս չստացված ծառայությունների և ապրանքների համար վճարված գումարները, չափվում են անվանական արժեքով:

2.6 Կրեդիտորական պարտքեր

Կրեդիտորական պարտքերը ներառում են վճարվելիք գումարները, որոնք չափվում են անվանական արժեքով:

2.7 Համաշխարհային Բանկի ֆինանսավորում

8229-AM և 8523-AM վարկային համաձայնագրերի համար ընդունելի ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով Համաշխարհային Բանկը վճարումներ է կատարում՝ օգտագործելով հետևյալ վճարման մեթոդներից մեկը կամ մի քանիսը.

ա) Հատուցում

Բանկը կարող է հատուցել փոխառուին՝ նրա սեփական միջոցներով կատարված ընդունելի ծախսերը ֆինանսավորելու նպատակով:

բ) Կանխավճար

Բանկը կարող է առհաշիվ վարկային վճարում կատարել փոխառուի հատուկ հաշվին՝ ընդունելի ծախսերը ֆինանսավորելու նպատակով և դրանց կատարմանը զուգընթաց, որոնց համար հիմնավորող փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն ավելի ուշ:

գ) Ուղղակի վճարումներ

Բանկը փոխառուի հայցով կարող է վճարումներ կատարել ուղղակիորեն երրորդ անձին՝ ընդունելի ծախսերի դիմաց:

դ) Հատուկ պարտավորագրեր

Բանկը կարող է վճարումներ կատարել երրորդ անձին հատուկ պարտավորագրի շրջանակներում ընդունելի ծախսերի փոխհատուցման համար փոխառուի գրավոր հաստատված հայցով, որը համաձայնեցված է փոխառուի և Բանկի կողմից:

3 Ծրագրի փակման ամսաթիվ

Համաձայն թիվ 8229-AM վարկային համաձայնագրի և թիվ 8523-AM վարկային համաձայնագրի՝ Ծրագրի վերջնաժամկետ է սահմանվել 2021թ. դեկտեմբերի 30-ը:

4 Կանխավճարներ

ԱՄՆ դոլար	2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
«Սիսիանի էֆ Փի Էյ Թի» ՍՊԸ (պայմանագրի համար CW-NCB-LRNIP-AF-2017/8)	-	39,070
«Եղեգնաձորի Ջեյ Վի ԱՐ ԲԻ Ի» ՓԲԸ և «Սիսիանի էֆ Փի Էյ Թի» ՍՊԸ (պայմանագրի համար CW-NCB-LRNIP-AF-2019/11)	140,168	-
«Սիսիանի էֆ Փի Էյ Թի» ՍՊԸ (պայմանագրի համար CW-NCB-LRNIP-AF-2019/17)	177,498	-
«Սիսիանի էֆ Փի Էյ Թի» ՍՊԸ (պայմանագրի համար CW-NCB-LRNIP-AF-2019/12)	77,455	-
«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ (պայմանագրի համար CW-NCB-LRNIP-AF-2019/10) (լոտ 1)	61,457	-
«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ (պայմանագրի համար CW-NCB-LRNIP-AF-2019/10) (լոտ 2)	11,737	-
Այլ	2,400	2,048
	470,715	41,118

5 Մնացորդներ բանկերում

ԱՄՆ դոլար	2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Հատուկ հաշիվ (վարկային համաձայնագիր թիվ 8229-AM)	38,995	41,871
Հատուկ հաշիվ (վարկային համաձայնագիր թիվ 8523-AM)	570,230	139,495
Տեղական հաշիվ (վարկային համաձայնագիր թիվ 8229-AM)	-	56
Տեղական հաշիվ (վարկային համաձայնագիր թիվ 8523-AM)	9,392	148,353
	618,617	329,775

6 Կրեդիտորական պարտքեր

ԱՄՆ դոլար	2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ	2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Հետերաշխիքային կրեդիտորական պարտքեր կապալառուներին	787,718	677,654
Կրեդիտորական պարտքեր կապալառուներին	222,507	335,411
Այլ	20,148	4
	1,030,373	1,013,069

7 Համաշխարհային Բանկի ֆինանսավորում

ՎԶՄԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 8229-ԱՄ

ԱՄՆ դոլար	2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
ԾՄՀ ընթացակարգեր	2,820	19,284,143
Այլ ընթացակարգեր	16,338	23,714,428
Հատուկ հաշվի կանխավճար/(մարում), զուտ	(19,158)	159,598
Սկզբնավճար	-	112,500
	-	43,270,669

ՎԶՄԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 8523-ԱՄ

ԱՄՆ դոլար	2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
ԾՄՀ ընթացակարգեր	7,926,749	24,612,927
Այլ ընթացակարգեր	1,407,675	7,666,146
Հատուկ հաշվի կանխավճար/(մարում), զուտ	(333,086)	4,396,926
Սկզբնավճար	-	100,000
	9,001,338	36,775,999

Ֆինանսավորման «Այլ ընթացակարգեր» մեթոդով՝ Կազմակերպությունը պահանջում է կանխավճար և հատուկ հաշվի փաստաթղթավորում՝ կից ուղարկելով այն թույլատրելի ծախսերի վճարումը հավաստող հիմնավորող փաստաթղթերը, որոնց գծով պայմանագրերի արժեքներն ավելին են, քան՝ փոխհատուցումների նամակում նշված սահմանաչափերը, ինչպես նաև այն պայմանագրերի համար, որոնք ենթակա են Համաշխարհային Բանկի նախնական ստուգմանը:

Ֆինանսավորման «ԾՄՀ ընթացակարգեր» մեթոդով՝ Կազմակերպությունը ներկայացնում է կանխավճարի պահանջ և հատուկ հաշվի փաստաթղթավորում՝ կից ուղարկելով ծախսերի մասին հաշվետվություն (ԾՄՀ):

Կազմակերպությունը պարբերաբար հաշվետվություններ է ներկայացնում հատուկ հաշվին կանխավճարով տրված միջոցների օգտագործման վերաբերյալ, ինչը բացահայտված է որպես հատուկ հաշվի կանխավճարի մարում:

8 Կառավարության համաֆինանսավորում

ՎԶՄԲ թիվ 8229-ԱՄ վարկային համաձայնագրով նախատեսված բոլոր ծախսերի համար գործում է 20% կառավարության համաֆինանսավորում: Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կառավարության համաֆինանսավորումը կազմել է 679 ԱՄՆ դոլար:

ՎԶՄԲ թիվ 8523-ԱՄ վարկային համաձայնագրով նախատեսված բոլոր ծախսերի համար գործում է 20% կառավարության համաֆինանսավորում: Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կառավարության համաֆինանսավորումը կազմել է 1,985,628 ԱՄՆ դոլար:

9 Ֆոնդերի օգտագործում ըստ հոդվածների

Ինչպես նկարագրված է 8229-AM և 8523-AM վարկային համաձայնագրերում, Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց օգտագործման մասին համախմբված հաշվետվությունում ծախսերը ներկայացված են երկու հոդվածով, որից մեկը միավորում է որոշ ենթահոդվածներ: Օգտագործողների հարմարության համար ֆոնդերի օգտագործման բացվածքը ներկայացված է ստորև.

ՎԶՄԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 8229-AM

ԱՄՆ դոլար

	2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Աշխատանքներ	-	47,923,866
Ապրանքներ	-	427,235
Խորհրդատվական ծառայություններ	3,603	4,748,980
Գործառնական ծախսեր և վերապատրաստում	-	867,478
Սկզբնավճար	-	112,500
	3,603	54,080,059

ՎԶՄԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 8523-AM

ԱՄՆ դոլար

	2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Աշխատանքներ	8,779,493	39,806,324
Ապրանքներ	72,440	731,671
Խորհրդատվական ծառայություններ	1,180,448	4,511,403
Գործառնական ծախսեր և վերապատրաստում	257,579	693,107
Սկզբնավճար	-	100,000
	10,289,960	45,842,505

10 Շրջանառու կապիտալի զուտ աճ

ԱՄՆ դոլար

	2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի	2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ
Բանկային հաշիվներում աճ	288,842	618,617
Կանխավճարների աճ	429,597	470,715
Կրեդիտորական պարտքերի աճ	(17,304)	(1,030,373)
	701,135	58,959

11 Կազմակերպության կողմից ստացված գումարների և Համաշխարհային Բանկի փոխհատուցումների համադրում

ՎԶՄԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 8229-AM

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի

ԱՄՆ դոլար

Հոդված	Դիմում	Կազմակերպություն	ՀԲ	Տարբերություն
Ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական ծառայություններ, խորհրդատուների ծառայություններ և Ծրագրի գործառնական ծախսեր				
	30-DA	19,158	19,158	-
		19,158	19,158	-
Հատուկ հաշվի կանխավճարի մարում				
	30-DA	(19,158)	(19,158)	-
		(19,158)	(19,158)	-
Ընդամենը		-	-	-

ՎՀՄԲ վարկային համաձայնագիր թիվ 8523-AM

2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի

ԱՄՆ դոլար

Հոդված	Դիմում	Կազմակերպություն	ՀԲ	Տարբերություն
Ապրանքներ, աշխատանքներ, ոչ խորհրդատվական ծառայություններ, խորհրդատուների ծառայություններ, Ծրագրի լրացուցիչ գործառնական ծախսեր և վերապատրաստումներ (բացառությամբ Ծրագրի Մաս 1(ե)) և 2 (բ) (ա)-ի)				
	23-DA	4,590,517	4,590,517	-
	25-DA	1,742,568	1,742,568	-
	29-DA	1,271,321	1,271,321	-
	30-DA	1,730,017	1,730,017	-
		9,334,423	9,334,423	-
Հատուկ հաշվի կանխավճար/(մարում), զուտ				
	23-DA	(3,590,517)	(3,590,517)	-
	24-DA	1,000,000	1,000,000	-
	25-DA	(1,742,568)	(1,742,568)	-
	26-DA	1,000,000	1,000,000	-
	27-DA	1,000,000	1,000,000	-
	28-DA	1,000,000	1,000,000	-
	31-DA	1,000,000	1,000,000	-
		(333,085)	(333,085)	-
Ընդամենը		9,001,338	9,001,338	-

12 Հետհաշվեկշռային իրադարձություններ

2020թ. մարտ ամսին Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 2019թ. դեկտեմբեր ամսին Չինաստանում բռնկված կորոնավիրուսը (COVID-19) դասակարգեց որպես համաճարակ: Կորոնավիրուսի բռնկման ազդեցությունը այս պահին անհայտ է: COVID-19-ի հետ կապված զարգացող իրավիճակը կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ Կազմակերպության գործունեության շարունակականության կամ գործառնությունների ծավալի վրա: 2020թ. մարտի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հայտարարել է երկրում արտակարգ իրավիճակ, որը կտևի մինչև 2020թ. հուլիսի 15-ը: Տվյալ ծրագրի համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունները չեն արտացոլում վերը նկարագրվածի հնարավոր ազդեցությունը:
